

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後他 地内			
路線名又は河川名等				
工事名	伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事（その4）			
工期	契約日の翌日から130日間			
事業課（所）名	南部区画整理事務所	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

施工延長				m	150
掘削	m3	5,200	土砂振り分け	m3	1,500
整地	m3	6,500	残土等処分	m3	1,560
公園除草工	m2	8,300			

施 工 理 由

本工事は、伏見西部第三地区内の公園予定地の整備に向けて、敷地の造成を行うものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	09:公園工事	
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
敷地造成工	掘削工	土砂振り分け（処分）	トンネルバケット、掘削・仕分け・積込作業含む	m3	2,195	
敷地造成工	残土処理工	残土等処分	粘性土	m3	4,500	管理費区分：Ⅰ
敷地造成工	残土処理工	残土等処分	汚染土	m3	21,670	管理費区分：Ⅰ
構造物撤去工	運搬処理工	刈草処分		t	35,000	管理費区分：Ⅰ
構造物撤去工	運搬処理工	支障木処分	枝葉	t	12,000	管理費区分：Ⅰ
構造物撤去工	運搬処理工	支障木処分	幹	t	1,000	管理費区分：Ⅰ
構造物撤去工	運搬処理工	支障木処分	根	t	18,000	管理費区分：Ⅰ
共通仮設費	技術管理費	地質調査費	ボーリング調査、土壌溶出試験（ヒ素、鉛）	式	3,230,000	管理費区分：Ⅸ

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事（その4）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基盤整備		式	1					
敷地造成工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削 （処分）	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3以上10,000m3未満	m3	100				単 1号	
土砂振り分け （処分）	トロンボカット，掘削・仕分け・積込作業含む	m3	1,500				単 2号	
掘削 （整地）	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：有り，施工数量：普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	5,100				単 3号	
整地 （整地）	作業区分：敷均し（ルース）	m3	6,500				単 4号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬 （粘性土）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1,460				単 5号（概）	
土砂等運搬 （汚染土）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	100				単 6号（概）	
残土等処分	粘性土	m3	1,460				単 7号	
残土等処分	汚染土	m3	100				単 8号	
公園除草工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事（その4）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
総合歩掛 （除草, 集草, 積込・運搬）	機械除草Ⅱ（ハッド・ガイト・肩掛式）	m2	8,300				単 9号(概)
構造物撤去工		式	1				
支障木伐採工		式	1				
支障木伐採 （幹周30cm未満）		本	20				単 10号(概)
支障木伐採 （幹周30cm以上、60cm未満）		本	10				単 11号(概)
支障木除根 （幹周30cm未満）		本	20				単 12号(概)
支障木除根 （幹周30cm以上、60cm未満）		本	10				単 13号(概)
木くず積込	機械積込	t	1.6				単 14号(概)
運搬処理工		式	1				
トラック2tによる公園外への運搬 （刈草）		台	10				単 15号(概)
木くず運搬 （支障木伐採）	機械積込	t	1.6				単 16号(概)
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	1				単 17号(概)
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	20				単 18号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事（その4）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6				単 19号(概)
刈草処分		t	18.7				単 20号
支障木処分	枝葉	t	0.3				単 21号
支障木処分	幹	t	0.9				単 22号
支障木処分	根	t	0.3				単 23号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 24号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6				単 26号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	31				単 27号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事（その4）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 11.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
地質調査費	ボーリング調査、土壌溶出試験（ヒ素、鉛）	式	1				内 1号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事（その4）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	地質調査費		ボーリング調査、土壌溶出試験（ヒ素、鉛）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	地質調査費(一式入力)	3230千円						単 40号 01-02-02
	WB010380		式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削 (処分)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量:5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3 未満	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂振り分け (処分)	トロンメルバケット, 掘削・仕分け・積込作業含む	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ 山積0. 8m3級			日	1. 6				
トロンメルバケット 細目, 50×50程度			月	0. 1				
運転手(特殊)			人	1. 6				
R0114								
普通作業員			人	3				
R0102								
軽油			L	140				
Z006702002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS30000004								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	掘削 (整地)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	整地 (整地)	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地 CB210610		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬 (粘性土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬 (汚染土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	残土等処分	粘性土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分	汚染土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	総合歩掛 (除草, 集草, 積込・運搬)	機械除草II (ハットカト・肩掛式)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		機械除草II (ハットカト・肩掛式)	m2	1			単 28号 05-01-02	
WB610180								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支障木伐採 (幹周30cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 07				
	造園工							[] [1]
	R0104		人	0. 3				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 65				
	チェーンソー							
			日	0. 35				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	支障木伐採 (幹周30cm以上、60cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 3				
	造園工							[] [1]
	R0104		人	0. 9				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2. 2				
	チェーンソー							
			日	0. 85				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	支障木除根 (幹周30cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 1				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 5				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 8				
	チェーンソー							
			日	0. 5				
	小型バックホウ 山積0. 13m3(平積0. 10m3)		時間	2				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	支障木除根 (幹周30cm以上、60cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 3				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	1				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1. 5				
	チェーンソー							
			日	0. 9				
	小型バックホウ 山積0. 13m3(平積0. 10m3)		時間	8				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 29号 60-01-12	
DY1414								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	トラック2tによる公園外への運搬 (刈草)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック2tによる公園外への運搬		有, 1. 7km以下	台	1			単 30号 05-01-02	
WB610170								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	木くず運搬 (支障木伐採)	機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 0km超え5km未満	t	1			単 31号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 2 3. 2km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 2 3. 2km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	刈草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 32号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	支障木処分	枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 33号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	支障木処分	幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 34号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	支障木処分	根	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 35号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 36号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 37号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 38号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 39号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB610180	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草II(ハットカイト・肩掛式)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
R0125			人	0. 4				
特殊作業員							[] [1] []	
R0101			人	0. 36				
普通作業員							[] [1] []	
R0102			人	1				
軽作業員							[] [1] []	
R0103			人	0. 07				
草刈機[肩掛式] カット径255mm							[] [1] []	
M002031005			日	0. 18				
草刈機[ハットカイト式・笹/ヨシ等用] 刈幅 95cm							[] [1] []	
M002031007			日	0. 18				
トラック[普通型] 2t積		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 41号 90-03-02 [] [1] []	
K0302002			時間	1. 6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 K0202015		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 3			単 42号 90-02-02 [] [2]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		10%	式	1			[2] []	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	有, 1. 7km以下	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積 K0302002		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0. 1			単 41号 90-03-02	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 0km超え5km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 56			単 43号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費刈草			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 枝葉		Y007600001002	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹		Y007600001003	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根		Y007600001004	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻(掘削)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(有筋)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB010380	地質調査費(一式入力)	3230千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費		Y007542000	式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 K0302002	トラック[普通型] 2t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積								
	M000302002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 K0202015	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20. 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工 事 名 伏見西部第三地区 3 号公園予定地整地工事（その 4）

工事場所 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後他 地内

1 一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 7 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 4 月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第 2 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休 2 日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休 2 日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第 3 条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。

2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第6条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 施工箇所の確認のため、事前に監督職員と現場立会いを行うこと。また、立会い時に確認した内容については工事打合簿で提出すること。
- 2 周囲には食品工場や自動車教習所等があるため、施工時の粉塵・騒音等には十分注意するとともに、必要に応じて散水等の対策を講じること。
- 3 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、本工事内容について正確に把握すること。その上で、設計書・図面を照査し、施工図書を作成の上、施工数量をまとめて事前に監督職員と協議するものとする。
- 4 週間工程表及び月間工程表については、以下の提出日までに監督職員へ提出すること。なお、工程表の様式については、監督職員と協議して決定すること。提出方法は電子メールも可とする。また、地域住民等から週間工程表を求められた場合は、前週金曜日までに持参すること。

提出書類	提出日
週間工程表	前週 木曜日 17 時まで
月間工程表	前月 25 日まで

- 5 地域住民等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。
- 6 工事用車両は道路上に駐車せず、現場内に駐車すること。車両等で現場内を通行する際には最徐行を行い、騒音、振動を最小限にするように作業員に徹底すること。

- 7 請負者は、本工事の実施に先立ち、監督職員と協議のうえ速やかに工事ビラ「〇〇工事のお知らせ」を作成し、工事着手1週間前までに工事場所の周辺住民、企業者等に周知すること。周知先については監督職員との打ち合わせにより決定する。
- 8 関係者以外の不法侵入を防ぐため、工事場所の鍵の管理及び施錠は、受注者が責任をもって行うこと。

第7条（掘削・土砂振り分け（処分）及び地質調査について）

1 掘削（処分）、土砂振り分け（処分）を実施するにあたり、下表の内容で地質調査を行う。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	数量
直接調査費	機械ボーリング	土質ボーリング (オールコアボーリング)	粘性土・シルト、50m 以下、鉛直 下方、φ86 mm	m	46
間接調査費	運搬費	試料運搬費		検体	50
		運搬費	特装車運搬(クローラ)：100m 超～ 300m 以下	式	1
		運搬費	資機材運搬：クレーン装置付き 2.9t 吊 2t 積、片道所要時間 1 時間、 運転台・日数 2 台・日	式	1
	準備費	準備及び跡片付け		式	1
	旅費交通費	旅費交通費	直接往復費：基地～現地 ライトバン 運転台数・日 10 台・日、基地～ 現地 ライトバン日当運転時間 2 時 間	式	1
直接業務費	土壌分析	土壌溶出試験	ヒ素及びその化合物	検体	50
		土壌溶出試験	鉛及びその化合物	検体	50

2 地質調査は、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法に準じて、下記の通り行うものとする。

(1) ボーリング調査

10m×10m メッシュごとにボーリング調査を実施することを基本とするが、区分け方については事前に監督員の承諾を得ること。

(2) 試料の採取方法

土量 100m³ 以下毎に 1 回調査をする必要あるため、試料はボーリング調査で得られたコア 1m 以下毎に採取するものとする。

(3) 試験方法

環告第 18 号による土壌溶出試験(ヒ素及びその化合物・鉛及びその化合物)

(4) 判定基準

鉛：基準値 0.01mg/l 以下、ヒ素：基準値 0.01mg/l 以下とする。

なお、試験には概ね 2～3 週間を要するため、施工計画立案時には考慮すること。また試験において基準値を超える鉛及びヒ素が確認された場合は、監督員と協議するものとする。

- 3 溶出試験において、鉛及びヒ素が基準値を超えない箇所の土砂については、振り分けを行い、「建設発生土（土砂（粘性土））」として第13条3項で指定する受入地で処分すること。基準値を超えた土砂は、「建設発生土（汚染土）」として第13条2項で指定する受入地で処分すること。

なお、基準値を超えた土砂の処分量は、過年度の実績から算出しており、処分の実績に合わせて設計変更を行う。

第8条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時～17時とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第9条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
本工事施行箇所	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第10条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第11条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
掘削工	掘削（処分）	施工時
掘削工	土砂振り分け（処分）	施工時

第 12 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
掘削（処分）	施工範囲の確認
土砂振り分け（処分）	施工範囲の確認
土質ボーリング	調査着手前の確認

4 建設副産物に関する事項

第 13 条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成 23 年 4 月 1 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1 ほか	設計運搬距離 L = 2.7km
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の 1 ほか	設計運搬距離 L = 18.8km
コンクリート塊 （有筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番ほか	設計運搬距離 L = 21.0km
建設発生木材 （枝葉）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45- 1 - 2	設計運搬距離 L = 0.2km
建設発生木材 （幹）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45- 1 - 2	設計運搬距離 L = 0.2km

建設発生木材 (根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45- 1 - 2	設計運搬距離 L = 0.2km
---------------	---	---------------------

<一般廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 (刈草)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 45- 1 - 2	設計運搬距離 L = 0.2km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分（試験結果が基準値を超えた場合））

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土 (汚染土)	(指定地処分) (株) チョウビ工業 京都府京都市伏見区竹田青池町 153 番地	設計運搬距離 L = 4.0km

建設発生土の搬出開始前に第 7 条の通り土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 12 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分（試験結果が基準値未満の場合））

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土 (土砂（粘性土）)	(指定地処分) (株) 京都夢産業 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内 39	設計運搬距離 L = 0.9km

本工事では土壌調査費（ヒ素、鉛以外）を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分にかかる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

第 14 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情に

より、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第 15 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 28 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 14 日前までに提出すること。

第 16 条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第 17 条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（１） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Android や iPhone 等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用


遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。
また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1 点の加点とする。

箇所図

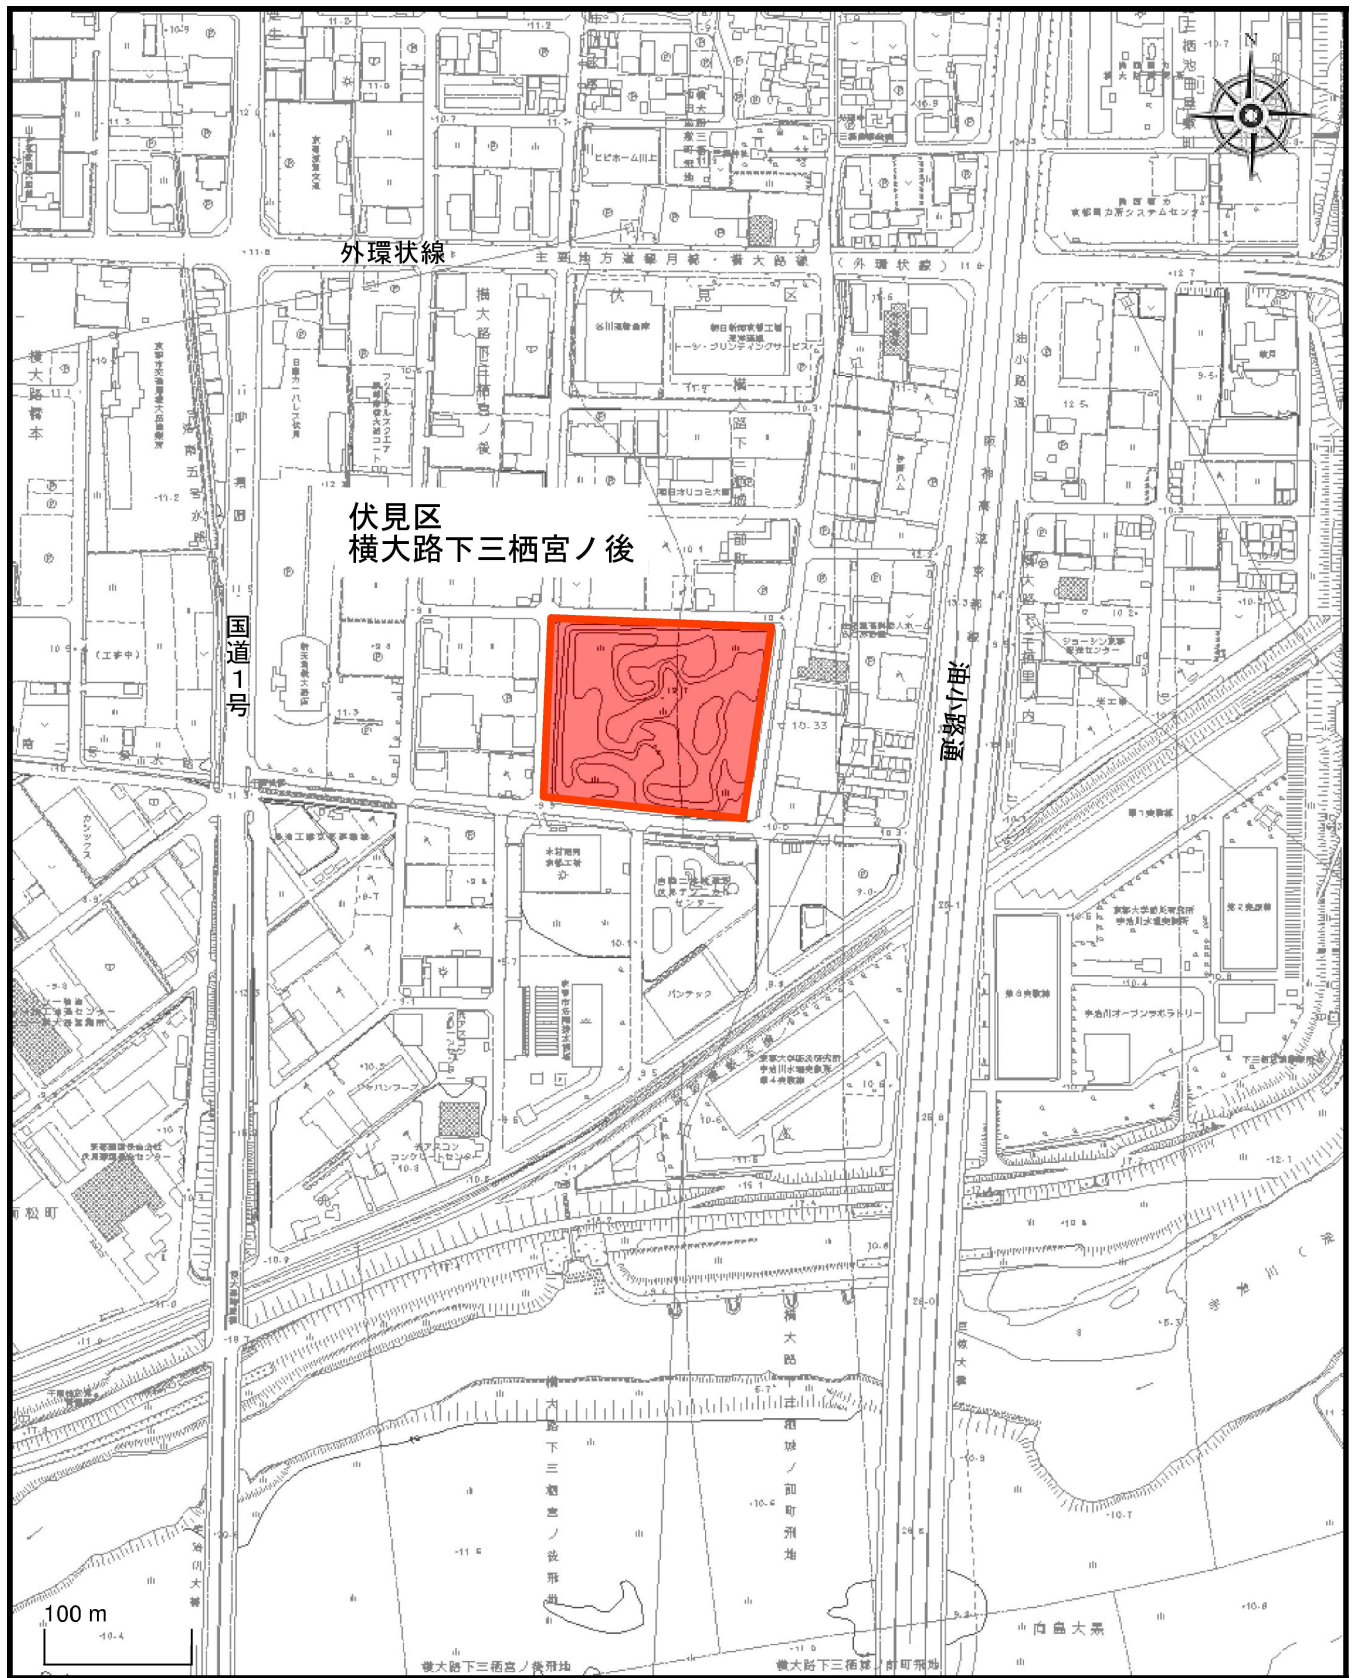

本工事施工箇所
